



Realizacja Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie
na lata 2016-2022 w okresie od 2016 roku
do 31.12.2019 r.

**RAPORT TRZYLETNI Z
REALIZACJI LOKALNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
NA LATA 2016-2022**



Spis treści

Słowo wstępne	2
Charakterystyka obszaru rewitalizowanego.....	2
Charakterystyka zamierzonych celów operacyjnych.....	3
Podsumowanie połowy okresu realizacji projektów	6
Analiza pozyskanych środków na działania rewitalizacyjne	20
Ocena skuteczności zaplanowanych i podjętych działań	8
Wnioski i rekomendacje	8

WYKAZ SKRÓTÓW:

UE - Unia Europejska

JST - jednostka samorządu terytorialnego

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FS - Fundusz Spójności

GPR - Gminny Program Rewitalizacji

LPR – Lokalny Program Rewitalizacji

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

OZE – Odnawialne Źródła Energii

ZSOiZ - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

ZSTiO "Meritum" - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"

ZS Specjalnych - Zespół Szkół Specjalnych

ZSP COGITO - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych "COGITO"

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

SCK - Siemianowickie Centrum Kultury

MOSiR – Miejski Ośrodek Polityki Społecznej



Podsumowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

29

Liczba projektów rewitalizacyjnych



8

Liczba projektów zrealizowanych



16

Liczba projektów w trakcie realizacji



15099

Liczba wspartych osób
w ramach projektów EFS



20

Liczba docieplonych budynków



3

Liczba odnowionych zabytków



1. Słowo wstępne

Zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji, powstałego w czerwcu 2014r., rewitalizacja to proces holistyczny. Definiowany jest on, jako zespół działań prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie, w celu osiągnięcia założonych przemian w obszarach kryzysowych. Jedną z naukowych definicji rewitalizacji określa ją, jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Przedstawiony raport zawiera wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego osiągniętych rezultatów Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). W części wstępnej przedstawiono cele, zasady formułowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ten kontekst historyczny i logistyczny jest wyjątkowo ważny z punktu widzenia przedstawionej w dalszej części raportu oceny realizacji i zaawansowania LPR. Raport zawiera ocenę zakresu osiągniętych celów strategicznych do 31 grudnia 2019 roku.

2. Charakterystyka obszaru rewitalizowanego

Na podstawie analizy danych statystycznych i ich graficznej prezentacji na mapach gridowych dokonano w rozdziałach 3.1-3.3 dokumentu źródłowego, identyfikacji nasilenia występowania zjawisk społecznych i gospodarczych, które mogą powodować zjawiska problemowe oraz uaktywniać procesy kryzysowe w wybranych obszarach miasta. Posłużenie się gridami, dało efekt w postaci precyzyjniejszej oceny przestrzennej koncentracji zjawisk problemowych oraz procesów kryzysowych w tych wymiarach. Przedstawiona w rozdziale 3.4 LPR analiza zjawisk i procesów kryzysowych w wymiarze urbanistyczno-infrastrukturalnym i ekologicznym stanowi dopełnienie w identyfikacji obszarów wymagających rewitalizacji.


Interpretacja ilościowej specyfiki zmian wewnątrzmijskich (dane kwantytatywne) i pozyskanie ocen jakościowych (ocena kwalitatywna) - dzięki obserwacjom warsztatowym i konsultacjom społecznym - pozwala na kompleksowe ujęcie zmian wewnątrzmijskich. Tym samym, łącznie z wielowymiarowym procesem identyfikacji zjawisk (społecznych, gospodarczych, urbanistyczno-infrastrukturalnych i ekologicznych), czyli podejściem kompleksowym, gwarantuje ona wypełnienie jednego z kluczowych warunków definiujących dobry lokalny program rewitalizacji.

Mając na uwadze powyżej opisaną specyfikę zmian w mieście, za pierwotne dla identyfikacji obszarów kryzysowych uznać należy negatywne tendencje i zmiany społeczne. Wskazując na obszary o podwyższonych parametrach negatywnych tendencji czy zmian zwrócono uwagę na dwa obszary – Śródmieście i obszar przyległy oraz Michałkowice i obszar przyległy.

W płaszczyźnie zdefiniowanych obszarów uznać można:

- negatywne tendencje społeczne w Śródmieściu i jego bezpośrednim sąsiedztwie (depopulacja, starzenie się ludności, niski wskaźnik liczby osób młodych, koncentracja problemów socjalnych oraz niższy poziom bezpieczeństwa publicznego),

- niepokojące tendencje gospodarcze (relatywnie niższy poziom przedsiębiorczości w Śródmieściu i podwyższone wskaźniki dotyczące bezrobocia oraz ich koncentracja w Śródmieściu),
- istniejące niedogodności urbanistyczne i infrastrukturalne w Śródmieściu oraz części Michałkowic,
- obszary o wysokim poziomie degradacji środowiskowej wymagające interwencji w zakresie rewitalizacji w Michałkowicach oraz sąsiedztwie Śródmieścia.

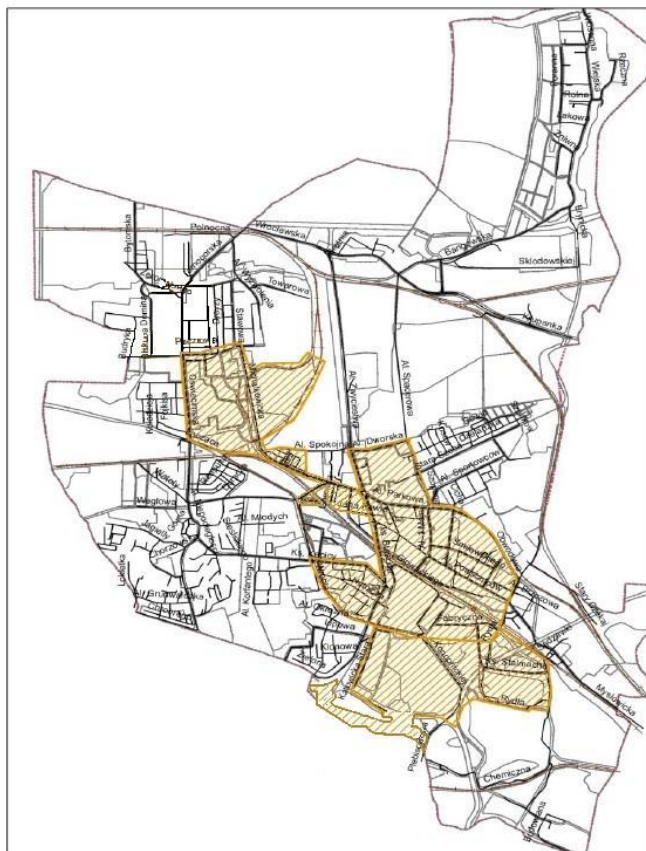

Rysunek 1. Mapa Siemianowic Śląskich z zaznaczonym obszarem zdegradowanym,

3. Charakterystyka zamierzonych celów operacyjnych


Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Siemianowic Śląskich na lata 2016-2022 jest wskazanie zintegrowanego podejścia kompleksowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji tych obszarów miasta, w których w największym stopniu występują negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze pogłębiane problemami urbanistycznymi, infrastrukturalnymi i ekologicznymi. Celem równoległym jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, w celu umożliwienia im tworzenia i wdrażania wszelakich inicjatyw i projektów oraz skutecznego ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie nr 318/2016 z dnia 19.12.2016 roku dokument (z późn. zm.) wskazuje w mieście dwa obszary zdegradowane: **Śródmieście ze Srokowcem** oraz **Michałkowice i Nowy Świat**. Łącznie obszar rewitalizacji stanowi 16,09%

ogółu powierzchni miasta, a ludność zamieszkująca ten teren –26,91% ogółu mieszkańców. Dane mieszkańców zliczono na podstawie danych meldunkowych zebranych w Wydziale Spraw Obywatelskich w UM. Obszar rewitalizacji wyznaczono zgodnie z Wytocznymi Ministerialnymi. Dla wskazanych obszarów przygotowano projekty rewitalizacyjne w podziale na 5 kierunków działań:

- Kierunek działań społecznych – projekty społeczne – S
- Kierunek działań w wymiarze gospodarczym – projekty gospodarcze – G
- Kierunek działań w wymiarze urbanistycznym – infrastrukturalnym – projekty urbanistyczno – infrastrukturalne – U
- Kierunek działań ekologicznych – projekty ekologiczne – E

Łącznie w dokumencie przedstawiono propozycję 29 projektów odpowiadających na zdiagnozowane problemy obszarów rewitalizowanych. Dla podkreślenia wagi projektu dla realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji projekty dla każdego kierunku działań zostały podzielone na projekty rdzeniowe i uzupełniające.

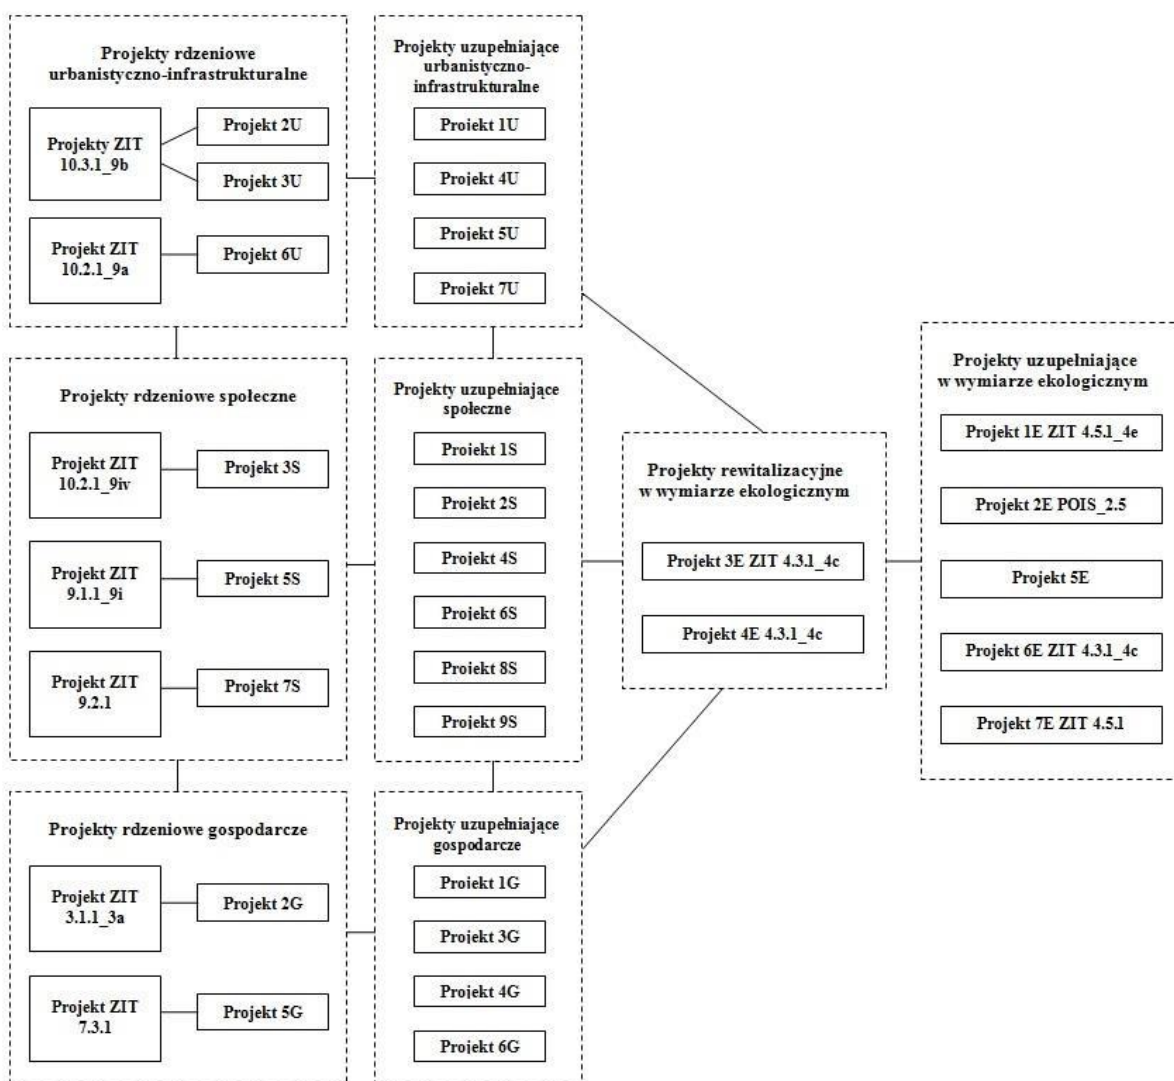

Rysunek 2 Podział projektów rewitalizacyjnych, Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022

Projektami rdzeniowymi są w pierwszej kolejności projekty SORSAL (Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywizacji Lokalnej), które łączą się z pozostałymi dwoma rdzeniowymi projektami społecznymi, mającymi jednakże kompleksowy charakter, gdyż zawierają w sobie również zadania infrastrukturalne, takie jak: centrum społeczno-kulturalne oraz Centrum Usług Społecznych. Szczególnie istotnym projektem podnoszącym atrakcyjność Śródmieścia jest rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego Donnesmarcków, który oprócz modernizacji obiektu wraz z otoczeniem zakładał wykreowanie oferty społecznej, kulturalnej i biznesowej wykorzystujące potencjał w postaci walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Osobną, komplementarną grupę projektów społecznych o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz sportowo-rekreacyjnym stanowią projekty uzupełniające: turniej dzielnic i amatorska liga piłkarska oraz cykliczne integracyjne działania kulturalne.

Projektami rdzeniowymi są też kompleksowe działania związane z modernizacją zabudowy śródmiejskiej w szczególności poprzez stworzenie nowej reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w Michałkowicach oraz rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego Zameczku. Z kolei projekty gospodarcze zostały umiejscowione w dwóch wiązkach – pierwszej odnoszącej się do projektów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz większej aktywności na rynku pracy oraz drugiej odnoszącej się do oferty terenów inwestycyjnych. Rdzeniowym projektem ekologicznym jest projekt likwidacji niskiej emisji w połączeniu z działaniami planowanymi w ramach ZIT (4.3.1._4c), a także termomodernizacji budynków komunalnych na terenie Nowego Świata. Dopełnieniem programu są projekty urbanistyczne i ekologiczne, które stanowią uzupełnienie pozostałych projektów.

Wszystkie projekty uzupełniające bezpośrednio dotyczą obszaru rewitalizowanego. Swoim zasięgiem okalają całą Gminę jednak kluczowe działania zarówno społeczne jak i infrastrukturalne będą podejmowane na zdegradowanym terenie.

W wyniku realizacji projektów rdzeniowych i uzupełniających, a więc przeprowadzonego procesu rewitalizacji, obszar Śródmieścia i Srokowca zgodnie z założeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie będzie miejscem oferującym:

- reprezentacyjne śródmiejskie przestrzenie publiczne atrakcyjne dla mieszkańców i otwarte na biznes, handel, usługi, kulturę i rekreację, charakteryzujące się wysoką funkcjonalnością, dobrym skomunikowaniem, estetyką oraz dużym poziomem bezpieczeństwa publicznego, w których będzie miejsce na realizację inicjatyw obywatelskich sprzyjających podnoszeniu integracji i spójności społecznej obszaru, w szczególności dotyczy to: Rynku, tradycyjnych śródmiejskich ulic handlowych tj. Powstańców i Świerczewskiego oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego Donnesmarcków;
- dobrą jakość zasobów mieszkaniowych sukcesywnie odnawianych, w których poprawie ulega zarówno standard zamieszkania, jak również funkcjonalność najbliższego otoczenia (przestrzeń osiedlowa, podwórka, place zabaw, parkingi itp.) ze względu na większą dbałość o „dobro wspólne” wykazywaną przez mieszkańców oraz ścisłą współpracę w zarządzaniu przestrzenią właścicieli i użytkowników nieruchomości;
- skuteczne narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dziedziczeniu ubóstwa oraz powstawaniu patologii społecznych;

- odnowa kwartału „Hugo” poprzez włączenie społeczne mieszkańców (rodziców z dziećmi) w powstawanie świetlicy jako Centrum Usług Społecznych, pełniące funkcję edukacyjno-integracyjną.
- sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich firm wykorzystujących lokalny potencjał tkwiący w społeczności miasta, pobudzany kompleksowymi działaniami na rzecz rozwoju zawodowego i osobowego prowadzonymi we współpracy szkół, Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych;
- przyjazny klimat dla inwestorów z profesjonalnym wsparciem i obsługą, od oferty inwestycyjnej do współpracy na etapie prowadzenia działalności gospodarczej;
- tereny inwestycyjne powstałe na obszarach przemysłowych Śródmieścia i Srokowca charakteryzujące się uregulowaną sytuacją własnościową, dobrą dostępnością komunikacyjną oraz zmodernizowaną infrastrukturą techniczną posiadający sprawnych gospodarzy prowadzących działalność gospodarczą lub społeczną,
- lepszą jakość środowiska wynikającą z działań związanych z ograniczaniem problemu tzw. niskiej emisji, rekultywacją terenów przemysłowych, usprawnieniem gospodarki odpadami, dbałością i eksponowaniem

4. Podsumowanie połowy okresu realizacji projektów

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022 trwa już 3 lata. Dokonanie ewaluacji dokumentu w połowie okresu jego obowiązywania stanowi doskonale narzędzie monitorujące postęp realizacji założeń programowych.

By w pełni uzyskać informacje o stopniu realizacji celów i założeń LPR zwrócono się do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz do miejskich Jednostek Organizacyjnych z prośbą o uzupełnienie Kart Ewaluacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022. Na podstawie wypełnionych kart ewaluacji można ocenić stopień realizacji celów LPR. Spośród 29 projektów rewitalizacyjnych z sukcesem zakończono realizację 8, a w trakcie realizacji jest 16 projektów.

Projekty urbanistyczno-infrastrukturalne – U

Na grupę projektów urbanistyczno – infrastrukturalny składają się 3 projekty rdzeniowe i 4 projekty uzupełniające:

Tabela 1 Projekty rdzeniowe urbanistyczno infrastrukturalne

Projekty rdzeniowe - urbanistyczno - infrastrukturalne					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób/obiektów z obszaru rewitalizowanego
2U	Reprezentacyjna przestrzeń publiczna w centrum Michałkowic –pl. 11-go Listopada, Planty Michałkowickie, Dom Technika „Zameczek” z Parkiem „Górnik” - ZIT 10.3.1	EFRR	2018	zrealizowano	11 774/1
3U	Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne	EFRR	2019	w trakcie realizacji	1
6U	Rozwój infrastruktury usługowej i mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich SORSAL	EFRR	2017	zrealizowano	1314/17

1. **Reprezentacyjna przestrzeń publiczna w centrum Michałkowic – plac 11-go Listopada, Planty Michałkowickie, Pałac Rheinbabenów z Parkiem „Górnik” (ZIT 10.3.1)** – Celem projektu były remont, przebudowa oraz udostępnienie do użytkowania przestrzeni publicznej, poprawa estetyki miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum dzielnicy Michałkowice oraz zwiększenie aktywizacji społecznej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Projekt zrealizowano w 2018 roku (Karta projektu 2U)



Rysunek 3 Planty Michałkowickie, źródło: Biuro Prasowe UM

2. **Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne** – projekt został podzielony na dwie części. Część pierwsza została zakończona i swoim zakresem obejmowała: roboty budowlane i instalacyjne, w tym m.in.: remont pokrycia i konstrukcji dachu, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont konserwatorski elewacji (w tym m.in. naprawa i odtworzenie gzymsów), wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku. W ramach drugiego etapu prac rewitalizacyjnych zostanie wykonany remont wnętrza Pałacu (m.in. posadzek, stolarki, okładzin ściennych), instalacji wewnętrznych (m.in. elektrycznych, wentylacji mechanicznej, co, cwu), renowacji zabytkowej oranżerii (m.in. w zakresie szklenia i konstrukcji stalowej) oraz część robót remontowych zewnętrznych budynku (m.in. schodów i tarasu, balustrad, obróbek blacharskich). Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2020 roku. (Karta projektu 3U)



Rysunek 4 Pałac Rheinbabenów, źródło: Biuro Prasowe UM

3. **Rozwój infrastruktury usługowej i mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich SORSAL** – na realizację projektu składały się dwa odrębne projekty finansowane ze środków EFR:
- a) Rozwój infrastruktury usługowej i mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich SORSAL (ZIT 10.2.1)(mieszkania socjalne) – Głównym celem projektu było - zwiększenie dostępu do lokali socjalnych i usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, przystosowanie 15 lokali komunalnych na mieszkania socjalne i dekoncentracja lokali socjalnych na terenie miasta. Projekt został zrealizowany w 2017 roku.
 - b) Rewitalizacja społeczna rejonu ulic Matejki/Fabrycznej oraz Okrężnej wraz ze stworzeniem świetlicy kulturalno-środowiskowej dla młodzieży (ZIT 10.2.1) - Celem głównym projektu było - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez przystosowanie

2 lokali a przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych dla dorosłych oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz szybki i łatwy dostęp do skoordynowanych działań społecznych dla mieszkańców (Karta projektu 6U)



Rysunek 5 Świetlica Środowiskowa przy ul. Matejki, źródło: Biuro Prasowe UM

Tabela 2 Projekty uzupełniające urbanistyczno - infrastrukturalne

Projekty uzupełniające - urbanistyczno - infrastrukturalne					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób/obiektów z obszaru rewitalizowanego
1U	Projekt wsparcia modernizacji kamienic stanowiących zasób publiczny i prywatny w Śródmieściu	UM + sektor prywatny	Od 2017	w trakcie	
4U	Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnermarcków wraz z terenami przyległymi	RPO WSL 2014-2020, środki prywatne		W trakcie	1500/1
5U	Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich	EFRR	2019	zrealizowano	brak danych/1
7U	Nowe funkcje na terenach pomiędzy Parkiem Górnik a Nowym Światem	inwestor prywatny	brak	brak	Brak danych

1. **Projekt wsparcia modernizacji kamienic stanowiących zasób publiczny i prywatny w Śródmieściu** – projekt, którego głównym celem jest Stworzenie programu zachęt dla właścicieli prywatnych w zakresie termomodernizacji i remontów kamienic. Realizację rozpoczęto w 2017 roku. Stworzono program zachęt dla właścicieli prywatnych w zakresie remontów kamienic - Uchwała Nr 520/2017 - zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części wybudowanych przed 1945 rokiem i położonych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, w których wykonano remont elewacji frontowej lub remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu). Uchwała nadal pozostaje w mocy tym samym projekt nadal jest w trakcie realizacji. (Karta projektu 1U)
2. **Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi** – projekt, którego celem jest remont, adaptacja i rozbudowa dawnego pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich, wpisanego do rejestru zabytków – nr rej. zab. A/1289/82. Inwestycja ma na celu kompleksowe odnowienie obiektów (w szczególności: budynku pałacowego, budynków bramnych, oficyny oraz stajni, niedźwiedziarni, maneżu i budynku gospodarczego), terenu i ogrodu pałacowego oraz przywrócenie dawnej świetności. Realizacja projektu odbywa się etapami:
 - Zakończenie I etapu, obejmującego rewitalizację budynku pałacowego, budynków bramnych, oficyny i części ogrodu pałacowego, planowane jest na 2021 rok
 - Zakończenie II etapu, obejmującego rewitalizację stajni, niedźwiedziarni, maneżu i budynku gospodarczego oraz otaczającej je części ogrodu pałacowego, planowane jest na 2023 rok. (Karta projektu 4U)



Rysunek 6 Pałac Donnersmarcków, źródło: Biuro prasowe UM

3. **Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich:** Celem głównym projektu był generalny remont oraz udostępnienie do użytkowania obiektu najstarszej w Polsce Pływalni Miejskiej, poprawa estetyki miasta poprzez remont elewacji obiektu zabytkowego oraz zwiększenie aktywizacji społecznej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Projekt został zrealizowany w 2019 roku. (Karta projektu 5U)



Rysunek 7 Park Hutnik, źródło: Biuro prasowe UM

Projekty społeczne S

Kierunek działań społecznych został podzielony na 9 projektów – 3 rdzeniowe i 6 uzupełniających:

Tabela 3 Projekty rdzeniowe społeczne

Projekty rdzeniowe - społeczne					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób/obiektów z obszaru rewitalizowanego
3S	Rewitalizacja społeczna rejonu ulic Matejki i Fabrycznej wraz ze stworzeniem świetlicy kulturalno-środowiskowej dla młodzieży	RPO WSL 2014-2020	2017	zakończona	1314/1

5S	SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej	EFS+EFRR	01.06.2018 r. - 31.05.2020	w trakcie	101
7S	Budowa i tworzenie mieszkań komunalnych w tym lokali socjalnych na obszarze rewitalizacji oraz usługi społeczne dla mieszkańców z terenów zdegradowanych	EFRR+UM	w trakcie realizacji	w trakcie	35

1. **Rewitalizacja społeczna rejonu ulic Matejki/Fabrycznej oraz Okrężnej wraz ze stworzeniem świetlicy kulturalno-środowiskowej dla młodzieży (ZIT 10.2.1)** - Celem głównym projektu było - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez przystosowanie 2 lokali a przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych dla dorosłych oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz szybki i łatwy dostęp do skoordynowanych działań społecznych dla mieszkańców. W ramach projektu zaadaptowano lokal przy ul. Matejki na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w której regularnie prowadzone są warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży. W placówce prowadzony był projekt „Ucieczka od bierności”, którego celem głównym był wzrost dostępności oraz wzrost jakości usług społecznych dla 140 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich poprzez utworzenie oraz działanie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci typu opiekuńczego oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (Karta projektu nr 3S)
2. **SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej** - Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 100 osób w wieku aktywności zawodowej należących do społeczności lokalnych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich tereny uznane w Lokalnym Programie Rewitalizacji za zdegradowane wymagające rewitalizacji (Michałkowice z "Nowym Światem" oraz Śródmieście ze Srokowcem), w okresie od 01.06.2018 r. - 31.05.2020 r (Karta projektu nr 5S)
3. **Budowa i tworzenie mieszkań komunalnych w tym lokali socjalnych na obszarze rewitalizacji oraz usługi społeczne dla mieszkańców z terenów zdegradowanych** – na realizację założeń projektowych składają się wewnętrzne działania Urzędu Miasta oraz zrealizowany projekt dofinansowany w ramach EFRR pn. Rozwój infrastruktury usługowej i mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich SORSAL (ZIT 10.2.1)(mieszkania socjalne), którego celem było zwiększenie dostępu do lokali socjalnych i usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, przystosowanie 15 lokali komunalnych na mieszkania socjalne oraz dekoncentracja lokali socjalnych na terenie miasta. (Karta projektu 7S)

Tabela 4 Projekty Uzupełniające społeczne

Projekty uzupełniające - społeczne					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób/obiektów z obszaru rewitalizowanego
1S	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi: Park Hutnik, Park Miejski, aleje spacerowe (place zabaw, siłownie na powietrzu)	EFRR + UM		w trakcie	Nie dotyczy/2
2S	Zagospodarowanie parterów na świetlice, Centrum Usług Społecznych, kluby dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby starsze)	EFS+EFRR	01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.	zrealizowano	132
4S	Nowe oblicze Nowego Świata –centrum społeczno-kulturalne osiedla z ofertą świetlicy środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego	Projekt nie jest realizowany	Projekt nie jest realizowany	Projekt nie jest realizowany	n/d
6S	Stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych	MRPiPS	Projekt nie jest realizowany	Projekt w trakcie oceny MRPiPS	n/d
8S	Aktywni na sportowo - turniej dzielnic oraz amatorska liga piłkarska.	UM	w trakcie realizacji	w trakcie	120
9S	Integracja Michałkowic i Nowego Świata z pozostałą częścią miasta poprzez wspólne i cykliczne działania kulturalne.	UM	w trakcie realizacji	w trakcie	150

4. **Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi: Park Hutnik, Park Miejski, aleje spacerowe (place zabaw, siłownie na powietrzu)** – na realizację założeń projektu składa się realizacja kilku równoległych działań finansowanych zarówno ze środków zewnętrznych jak i własnych miasta. Największym działaniem w ramach tego projektu była realizacja dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu: Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi - Park Hutnik, którego jednym z zadań była adaptacja istniejącej misy dawnego zbiornika wodnego (po jej zasypaniu) na funkcje rekreacyjne w postaci siłowni zewnętrznej, placu zabaw i fontanny „chodnikowej”, przebudowę, uzupełnienie i modernizację alejek, wraz z przebudową wejścia głównego do parku oraz przebudowę oświetlenia parku. Realizację projektu zakończono w 2019 roku. W ramach projektu

rewitalizacyjnego zostały wyremontowane skwery w mieście w tym znajdujący się na obszarze rewitalizacji skwer Laury przy ul. Waryńskiego. (Karta projektu 1S)



Rysunek 8 Park Hutnik, źródło: Biuro prasowe UM



Rysunek 9 Skwer Laura, źródło: Biuro prasowe UM

5. **Zagospodarowanie parterów na świetlice, Centrum Usług Społecznych, kluby dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby starsze)** – projekt realizowany w połączeniu z projektem kierunku urbanistyczno – infrastrukturalnego pn. Rewitalizacja społeczna rejonu ulic Matejki/Fabrycznej oraz Okrężnej wraz ze stworzeniem świetlicy kulturalno-środowiskowej dla młodzieży (ZIT 10.2.1). (Karta projektu 2S)



Rysunek 10 Świetlica środowiskowa przy ul. Matejki, źródło: Biuro prasowe UM

6. **Aktywni na sportowo - turniej dzielnic oraz amatorska liga piłkarska** – projekt uzupełniający realizowany przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, którego celem jest integracja lokalnych społeczności z różnych dzielnic, ze szczególnym uwzględnieniem integracji mieszkańców Michałkowic i Nowego Świata (badania ankietowe przed i po każdym sezonie ligowym), zwiększanie się zainteresowania udziałem w tym przedsięwzięciu (porównywanie ilości chętnych drużyn do udziału w rozgrywkach w poszczególnych latach), zmiana stereotypów (mentalności i wyobrażeń) mieszkańców innych rejonów miasta dotyczących mieszkańców Nowego Świata oraz zredukowanie zachowań i działań kryminogennych poprzez promowanie zasad fair - play w sportowej rywalizacji (analiza statystyk w tym zakresie na przestrzeni lat). Projekt jest w trakcie realizacji (Karta projektu 8S)
7. **Integracja Michałkowic i Nowego Świata z pozostałą częścią miasta poprzez wspólne i cykliczne działania kulturalne** - celem projektu jest wzmocnienie poczucia przynależności – małe ojczyzny, integracja z innymi dzielnicami, edukacja kulturalna, wyrobienie nawyków korzystania z oferty kulturalnej siemianowickich instytucji kultury. Zorganizowano imprezy integracyjne w ramach Dni Siemianowic organizowało Siemianowickie Centrum Kultury przy wsparciu Wydziału Kultury i Sportu , impreza na

Nowym Świecie organizowana była przez Wydział Kultury i Sportu przy współpracy z SCK-Park Tradycji. Projekt jest w trakcie realizacji. (Karta projektu 9S)

Projekty gospodarcze – G

Na grupę projektów gospodarczych składają się 2 projekty rdzeniowe i 4 uzupełniających:

Tabela 5 Projekty rdzeniowe gospodarcze

Projekty rdzeniowe - gospodarcze					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób z obszaru rewitalizowanego
2G	Biznes Park Srokowiec spójny komunikacyjnie z GPP - Górnośląskim Parkiem Przemysłowym w Katowicach – uzbrojenie terenów brownfield	UM	brak	nie rozpoczęto realizacji	nie dotyczy
5G	Tworzenie warunków dla reintegracji zawodowej mieszkańców, w tym możliwości samozatrudnienia	EFS	2018-2020	w trakcie	8

1. **Business Park Srokowiec spójny komunikacyjnie z GPP – Górnośląskim Parkiem Przemysłowym w Katowicach – uzbrojenie terenów brownfield (ZIT 3.1.1)** –Celem projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego Miasta i regionu poprzez nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield w Siemianowicach Śląskich. Miasto Siemianowice Śląskie to miasto poprzemysłowe, na terenie którego mimo niewielkiej powierzchni (25 km²) prowadzono intensywną eksploatację złóż węgla kamiennego oraz rudy cynku i ołowiu. Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie obszarów poprzemysłowych, terenów inwestycyjnych miasta w sieć kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną, oświetleniową i drogową wraz z planem promocji. Projekt obecnie nie jest realizowany (Karta projektu 2G)
2. **Tworzenie warunków dla reintegracji zawodowej mieszkańców, w tym możliwości samozatrudnienia** – Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości - Celem projektu jest zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 15 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących obszar Gminy Siemianowice Śląskie, należących do jednej z grup w trudnej sytuacji rynkowej (narażonej na wykluczenie zawodowe), poprzez pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie przyznanych bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Tym samym celem projektu był rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Gminie i spadek bezrobocia w mieście. (Karta projektu 5G)

Tabela 6 Projekty uzupełniające gospodarcze

Projekty uzupełniające - gospodarcze					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób z obszaru rewitalizowanego
1G	Rewitalizacja terenu byłej Huty „Jedność” S.A. poprzez nadanie nowych funkcji techniczno-produkcyjnych	Inwestor prywatny	brak	nie rozpoczęto realizacji	nd
3G	Rozwój instytucji wspomagających i kreujących przedsiębiorczość	UM	w trakcie	w trakcie	nd
4G	Poprawa warunków i klimatu dla lokalnego biznesu oraz inwestorów zewnętrznych	UM	w trakcie	w trakcie	nd
6G	Program aktywizacji i wykorzystania potencjału seniorów ułatwiający powrót rodziców na rynek pracy	UM	w trakcie	w trakcie	nd

3. **Rewitalizacja terenu byłej Huty „Jedność” S.A. poprzez nadanie nowych funkcji techniczno-produkcyjnych.** – Teren stanowi własność prywatną i to w gestii właściciela leży przystąpienie do zagospodarowania przestrzeni. Gmina nie ma wpływu na termin rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia. Uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru, które umożliwia realizację zabudowy usługowej oraz zabudowy usług o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². (Karta projektu 1G)
4. **Rozwój instytucji wspomagających i kreujących przedsiębiorczość** – Projekt w trakcie realizacji, którego celem jest Powołanie Biura Obsługi Inwestora, powołanie Rady Gospodarczej, kreowanie przedsiębiorczości poprzez cykliczne szkolenia/spotkania zarówno przedsiębiorców, młodzieży jak i najmłodszych, organizacja warsztatów i spotkań dla sektora MMŚP w Siemianowicach Śląskich (Karta projektu 3G)
5. **Poprawa warunków i klimatu dla lokalnego biznesu oraz inwestorów zewnętrznych** – celem projektu jest rozpoznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców poprzez przeprowadzenie ankiet wśród przedstawicieli lokalnych firm i przedsiębiorstw, analizę danych posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy, analizę potencjału inwestycyjnego terenów gminnych pod kątem przyszłego wykwalifikowania i wyspecjalizowania potencjalnych pracowników. Współpraca z nowo powstałym na terenie miasta Biurem Obsługi Inwestora, w zakresie promowania przedsiębiorczości, stwarzania możliwości założenia działalności gospodarczej oraz nieodpłatne świadczenie usług doradztwa na początkowym etapie jej rozwoju. Stworzenie Siemianowickiej Akademii Przedsiębiorczości (Karta projektu 4G)

6. **Program aktywizacji i wykorzystania potencjału seniorów ułatwiający powrót rodziców na rynek pracy** – celem projektu jest integracja mieszkańców, zacieśnienie więzi społecznych, współpraca międzypokoleniowa, wykorzystanie potencjału i talentów ludzkich i ich promocja, rozwijanie aktywności społecznej poprzez zadania oraz powrót do tradycji rodzinnego spędzania czasu. Cele w większości zrealizowano we współpracy z jednostkami miejskimi: SCK, Biblioteką Miejską, Pływalnią Miejską, MOSIR, Muzeum Miejskim ze względu na szeroką dostępność dla Seniorów w różnych dzielnicach miasta. Zadania dostosowano potrzeb seniorów oraz ich do zainteresowań i możliwości. Cele projektowe poszerzono o rozwijanie aktywności ruchowej, edukację cyfrową, zdrowotną i kulturalną. (Karta projektu 6G)

Projekty ekologiczne E

W grupie projektów ekologicznych wyróżniono 2 projekty rdzeniowe i 5 projektów uzupełniających:

Tabela 7 Projekty rdzeniowe ekologiczne

Projekty rdzeniowe - w wymiarze ekologicznym					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób/obiektów z obszaru rewitalizowanego
3E	Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła	EFRR	od 2017	zrealizowano	44 gospodarstwa domowe
4E	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie	EFRR + POiŚ	od 2017	w trakcie	20 budynków wielorodzinnych

1. **Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła (ZIT 4.3.1)** - celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców subobszaru „Śródmieście ze Srokowcem” poprzez likwidację nieefektywnych palenisk węglowych oraz tym samym poprawę jakości powietrza podłączenie budynków do sieci CO. W ramach projektu nastąpiło zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. (Karta projektu 3E)
2. **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie** – projekt ekologiczny realizowany poprzez grupę projektów „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie” ETAP 1, 2, 3 i 4. Celem projektów jest - ocieplenie budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, obniżenie kosztów

utrzymania budynków, poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, częściowa realizacja założeń PGN w gminie, wzrost komfortu użytkowania budynków, wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią. (Karta projektu 4E)



Rysunek 11 Osiedle Nowy Świat, źródło: Biuro prasowe UM

Tabela 8 Projekty uzupełniające ekologiczne

Projekty uzupełniające - w wymiarze ekologicznym					
Numer projektu	Tytuł	Źródło finansowania	Realizacja	Stan	Liczba wspartych osób/obiektów z obszaru rewitalizowanego
1E	Stworzenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z rozbudową rowerowych szlaków komunikacyjnych oraz punktów przesiadkowych	EFRR	2018	zrealizowano	nd
2E	Zieleń miejska –naturalne bogactwo miejskie	POIŚ	w trakcie	w trakcie	nd

5E	Projekt likwidacji niskiej emisji w Gminie. (dot. instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w domach oraz przestrzeniach publicznych, Promocja budownictwa pasywnego, jako działanie dodatkowe)	EFRR	w trakcie	w trakcie	nd
6E	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej	EFRR	2017-2019	zrealizowano	1
7E	Jasno bezpiecznie ekologicznie (projekt etapowy)	EFRR	2018 (ETAP II 2020)	w trakcie	nd

3. **Stworzenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z rozbudową rowerowych szlaków komunikacyjnych oraz punktów przesiadkowych (ZIT 4.5.1)** - Celem projektu było utworzenie 4 Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych wraz z obiektami typu Bike&Ride oraz Park&Ride, utworzenie ok 17km dróg rowerowych a tym samym zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w mieście. Projekt został zakończony w 2018 roku. (Karta projektu 1E)



Rysunek 12 Park&Ride wraz ze ścieżką rowerową, Bażantarnia, źródło: Biuro prasowe UM

4. **Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie** - Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w Siemianowicach Śląskich. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni, powstałych dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych i rewitalizacji istniejących parków. Zwiększenie zielonych terenów umożliwi między innymi:

- nadanie nowych funkcji tym terenom (istotnych i dostępnych dla społeczności lokalnej),
- poszerzenie zakresu roślinności w mieście (co udowadnia ekologiczność niniejszego rozwiązania oraz znacznie zwiększy występującą w Siemianowicach Śląskich różnorodność biologiczną),
- przywrócenie aktywności biologicznej na terenach przemysłowych (obecnie nie nadających się do jakichkolwiek działań),
- zwiększenie obszarów wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz mieszkańców sąsiadujących miast,
- zwiększenie bezpiecznych miejsc lęgowych dla ptaków poprzez usunięcie zagrożeń w postaci zanieczyszczeń i zdegradowanych terenów przemysłowych.

Całkowita powierzchnia terenu objętego projektem stanowi 468 300 m². W tym tereny zielone 464 215m², co stanowi 99,13% całej powierzchni objętej projektem. W wyniku realizacji projektu powstanie 89 550m² nowej powierzchni biologicznie czynnej oraz 5 585m² ścieżek pieszych i pieszo – rowerowych. (Karta projektu 2E)

5. **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZIT 4.3.1)** - Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: PUP, MOPS, MOSIR, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół Sportowych, Meritum, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich. Cele cząstkowe to min. zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków, obniżenie kosztów utrzymania budynków, poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, częściowa realizacja założeń PGN w gminie. Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować również wzrost komfortu użytkowania budynków, stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią. Projekt częściowo w realizacji. Zrealizowano zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach PUP, MOPS, MOSIR i SP1. (Karta projektu 6E)
6. **Jasno, bezpiecznie, ekologicznie** – projekt realizowany poprzez 2 projekty: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii - ETAP 1 i 2. Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Siemianowice Śląskie. Cele cząstkowe to obniżenie wydatków na energię, spełnienie przez zmodernizowany system oświetleniowy normy PN-EN 13201, osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO₂, obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia. Pierwszy etap realizacji projektu został zakończony w 2018 roku. Etap 2 zostanie ukończony 30.06.2020 roku. (Karta projektu 7E)

5. Analiza pozyskanych środków na działania rewitalizacyjne

Spośród 29 projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022, 17 zostało dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Główne źródła finansowania to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz

Społeczny oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Łącznie na realizację projektów rewitalizacyjnych Gmina Siemianowice Śląskie pozyskała ponad 70 milionów złotych dofinansowania.

6. Ocena skuteczności zaplanowanych i podjętych działań

Aby dokonać rzetelnej oceny skuteczności zaplanowanych i podjętych działań należy powyższe projekty zestawzić razem ze zdiagnozowanymi problemami. Zgodnie z założeniem projektów rdzeniowych i uzupełniających, a więc przeprowadzeniem procesu rewitalizacji, obszar Śródmieścia i Srokowca zgodnie z założeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie staje się miejscem oferującym:

- reprezentacyjne śródmiejskie przestrzenie publiczne atrakcyjne dla mieszkańców i otwarte na biznes, handel, usługi, kulturę i rekreację, charakteryzujące się wysoką funkcjonalnością, dobrym skomunikowaniem, estetyką oraz dużym poziomem bezpieczeństwa publicznego, w których jest miejsce na realizację inicjatyw obywatelskich sprzyjających podnoszeniu integracji i spójności społecznej obszaru.
- dobrą jakość zasobów mieszkaniowych sukcesywnie odnawianych, w których poprawie ulega zarówno standard zamieszkania, jak również funkcjonalność najbliższego otoczenia (przestrzeń osiedlowa, podwórka, place zabaw, parkingi itp.) ze względu na większą dbałość o „dobro wspólne” wykazywaną przez mieszkańców oraz ścisłą współpracę w zarządzaniu przestrzenią właścicieli i użytkowników nieruchomości;
- sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich firm wykorzystujących lokalny potencjał tkwiący w społeczności miasta, pobudzany kompleksowymi działaniami na rzecz rozwoju zawodowego i osobowego prowadzonymi we współpracy szkół, Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych;
- przyjazny klimat dla inwestorów z profesjonalnym wsparciem i obsługą, od oferty inwestycyjnej do współpracy na etapie prowadzenia działalności gospodarczej;
- lepszą jakość środowiska wynikającą z działań związanych z ograniczaniem problemu tzw. niskiej emisji, rekultywacją terenów poprzemysłowych, usprawnieniem gospodarki odpadami, dbałością i eksponowaniem terenów zielonych.

Zauważyć można, że projekty w ramach poszczególnych grup projektów wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Świadczy to o kompleksowym podejmowaniu działań i dopasowanej interwencji. Taką zależność widać wyraźnie w przypadku projektu pn. Rewitalizacja społeczna rejonu ulic Matejki/Fabrycznej oraz Okrężnej wraz ze stworzeniem świetlicy kulturalno-środowiskowej dla młodzieży (ZIT 10.2.1), który jest wskazany zarówno w grupie projektów społecznych jak również urbanistyczno-infrastrukturalnych.

Kompleksowa realizacja założeń programowych LPR wynika także pośrednio z pozyskania na ten cel funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie bowiem z założeniami RPO WSL 2014-2020 projekty infrastrukturalne realizowane są tylko przy jednoczesnej realizacji projektów społecznych. Przykładem takiego powiązania jest min. realizacja projektu pn. Rewitalizacja społeczna rejonu ulic Matejki/Fabrycznej oraz Okrężnej wraz ze stworzeniem świetlicy kulturalno-

środowiskowej dla młodzieży (projekt EFRR - ZIT 10.2.1) wraz z zrealizowanym przez MOPS projektem pn. Ucieczka od bierności (projekt EFS – ZIT 9.2.1).

Warto też zauważyć, że w wypełnienie założeń projektowych LPR wpisują się działania nie uwzględnione bezpośrednio w wiążkach projektowych. Takim działaniami są min. sukcesywne remonty chodników i ulic na obszarach zdegradowanych znacząco poprawiające estetykę tych obszarów, liczne wydarzenia kulturalne i sportowe nie związane bezpośrednio z rewitalizacją, jednak mające wpływ na mieszkańców tych obszarów w sposób pośredni – zwiększają aktywność społeczną mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych na obszarze nie uwzględnionym w dokumencie źródłowym również pośrednio pomagają realizować jego cele. Zmodernizowana infrastruktura sportowa i rekreacyjna stanowi bowiem zachętę dla mieszkańców obszarów zdegradowanych do podejmowania aktywności fizycznej a co za tym idzie dbałości o zdrowie i poprawę jakości życia.

7. Wnioski i rekomendacje

Analizując stopień realizacji projektów rdzeniowych i uzupełniających Lokalnego Programu Rewitalizacji można wyciągnąć następujące wnioski:

- Największy stopień zaawansowania osiągnięto w grupie projektów o wymiarze Ekologicznym. Spośród łącznie 7 projektów 3 zostały zrealizowane, a 4 są w trakcie realizacji kolejnych etapów (projekty 4E, 2E, 5E, 7E).
- Najmniejszy stopień zaawansowania osiągnięto w grupie projektów o wymiarze Gospodarczym gdzie spośród 6 projektów ani jeden nie został zrealizowany, a jeden z nich w ogóle nie jest realizowany.
- Istnieje ryzyko niezrealizowania projektów, które z założenia miały zostać zrealizowane przez prywatnych inwestorów tj. projekt pn. Nowe funkcje na terenach pomiędzy Parkiem Górnik a Nowym Światem oraz projekt pn. Rewitalizacja terenu byłej Huty „Jedność” S.A. poprzez nadanie nowych funkcji techniczno-produkcyjnych
- Należy zintensyfikować działania w projektach społecznych: spośród 9 projektów tylko dwa zostały zakończone, a jeden w dalszym ciągu nie jest realizowany.
- Należy zwrócić większą uwagę na monitoring i ewaluację projektów – obecnie nie wszystkie dane potrzebne do ewaluacji są możliwe do pozyskania. Komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, do których zwrócono się z prośbą o podsumowanie działań nie posiadały kompletnych danych, w szczególności dot. liczby wspartych osób z obszarów rewitalizowanych.

KARTY PROJEKTÓW:

Projekty urbanistyczno – infrastrukturalne

Projekt 2U

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Reprezentacyjna przestrzeń publiczna w centrum Michałkowic – plac 11-go Listopada, Planty Michałkowickie, Pałac Rheinbabenów z Parkiem „Górnik” (ZIT 10.3.1)
2	Zakładane cele	- remont, przebudowa oraz udostępnienie do użytkowania przestrzeni publicznej - poprawa estetyki miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum dzielnicy Michałkowice - zwiększenie aktywizacji społecznej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele zostały zrealizowane w 2018 roku
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	W ciągu 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu ze wspartej infrastruktury skorzystało 51 192 osób
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	W ciągu 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu ze wspartej infrastruktury skorzystało 11 774 osób z terenu rewitalizowanego
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekty komplementarne i powiązane realizowane przez MOPS obejmują formy wsparcia realizowane na terenie Przestrzeni Publicznej, m.in. w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej”
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost aktywności społecznej osób należących do społeczności lokalnych zamieszkujących subobszar „Michałowice z Nowym Światem” a także „Śródmieście ze Srokowcem”, ponadto projekt ma istotny wpływ na poprawę estetyki subobszaru „Michałowice z Nowym Światem”
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Trwają prace rewitalizacyjne w przylegającym do przestrzeni publicznej Pałacu Rheinbabenów

Projekt 3U

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Rewitalizacja społeczna rejonu ulic Matejki/Fabrycznej oraz Okrężnej wraz ze stworzeniem świetlicy kulturalno-środowiskowej dla młodzieży (ZIT 10.2.1)
2	Zakładane cele	- zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem - przystosowanie 2 lokali a przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych dla dorosłych oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - szybki i łatwy dostęp do skoordynowanych działań społecznych dla mieszkańców,
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele zostały zrealizowane w 2017 roku
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Zrealizowano wskaźnik pn. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w okresie 12 miesięcy na poziomie 1279 osób
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Brak danych
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekty komplementarne i powiązane realizowane przez MOPS obejmują formy wsparcia realizowane wśród osób korzystających z lokali socjalnych, m.in. w ramach projektu „Ucieczka od bierności”
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Formy wsparcia realizowane w placówkach przy ul. Matejki oraz Okrężnej skierowany jest głównie do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących tereny subobszaru „Michałowice z Nowym Światem” oraz „Śródmieście ze Srokowcem”
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Realizacja kolejnych projektów dofinansowanych w ramach EFS przez MOPS Siemianowice Śląskie z wykorzystaniem wyremontowanych obiektów infrastrukturalnych

Projekt 6U

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Rozwój infrastruktury usługowej i mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich SORSAL (ZIT 10.2.1) (mieszkania socjalne)
2	Zakładane cele	- zwiększenie dostępu do lokali socjalnych i usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem - przystosowanie 15 lokali komunalnych na mieszkania socjalne - dekoncentracja lokali socjalnych na terenie miasta
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele zostały zrealizowane w 2017 roku
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	51
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	35
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekty komplementarne i powiązane realizowane przez MOPS obejmują formy wsparcia realizowane wśród osób korzystających z lokali socjalnych, m.in. w ramach projektu „Ucieczka od bierności”
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Wśród 15 wyremontowanych lokali, 10 znajduje się na terenie subobszaru „Michałowice z Nowym Światem” oraz „Śródmieście ze Srokowcem”
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Trwają prace remontowe w ramach projektu remontu 16 lokali w ramach projektu SORSAL II, planuje się realizację projektu SORSAL IV, obejmującego remont 39 lokali

Projekt 1U

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	Projekt wsparcia modernizacji kamienic stanowiących zasób publiczny i prywatny w Śródmieściu.
2.	Zakładane cele	Stworzenie programu zachęt dla właścicieli prywatnych w zakresie termomodernizacji i remontów kamienic.
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	Stworzono program zachęt dla właścicieli prywatnych w zakresie remontów kamienic - Uchwała Nr 520/2017 - zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części wybudowanych przed 1945 rokiem i położonych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, w których wykonano remont elewacji frontowej lub remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu).
4.	Kiedy będą zrealizowane?	Uchwała jest nadal aktualna
5.	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	0
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	0
7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części wybudowanych przed 1945 rokiem i położonych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, w których wykonano remont elewacji frontowej lub remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu).
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do poprawy estetyki przestrzeni wokół budynków, a także polepszenia standardu budynków.
9.	Dalsze działania rewitalizacyjne	W dalszym ciągu kontynuowane będą działania zmierzające do modernizacji kamienic stanowiących zasób publiczny i prywatny w Śródmieściu.

Projekt 4U

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	
Nazwa projektu	Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi
Zakładane cele	Remont, adaptacja i rozbudowa dawnego pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich, wpisanego do rejestru zabytków – nr rej. zab. A/1289/82. Inwestycja ma na celu kompleksowe odnowienie obiektów (w szczególności: budynku pałacowego, budynków bramnych, oficyny oraz stajni, niedźwiedziarni, maneżu i budynku gospodarczego), terenu i ogrodu pałacowego oraz przywrócenie dawnej świetności.
Czy zrealizowano cele projektu?	Projekt jest w trakcie realizacji.
Kiedy będą zrealizowane?	Projekt realizowany będzie w etapach. 1. Zakończenie I etapu, obejmującego rewitalizację budynku pałacowego, budynków bramnych, oficyny i części ogrodu pałacowego, planowane jest na 2021 rok 2. Zakończenie II etapu, obejmującego rewitalizację stajni, niedźwiedziarni, maneżu i budynku gospodarczego oraz otaczającej je części ogrodu pałacowego, planowane jest na 2023 rok
Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	Okolo 1500 osób w 2019 roku
Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Realizator nie prowadzi analizy umożliwiającej wskazanie łącznej liczby osób z terenu rewitalizowanego odwiedzających rewitalizowane obiekty.
Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	W ramach realizacji projektu OGRÓD MOŻLIWOŚCI - szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS realizowano Program Aktywności Lokalnej i Program Aktywności Społeczno-Zatrudnieniowej, którymi objęto dotychczas 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszary rewitalizowane, ich rodziny i otoczenie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: – Przeprowadzono cykl 5 warsztatów z zakresu aktywności lokalnej; – Przeprowadzono cykl 10 warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych; – Realizowano coaching indywidualny i poradnictwo psychologiczne – Prowadzono działania animacyjne – Przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu – Prowadzono pośrednictwo pracy ukierunkowane na poszukiwanie miejsc odbywania staży i zbudowanie relacji pomiędzy stażystami, a potencjalnymi organizatorami staży – Zorganizowano staż dla 3 uczestniczek projektu – Zorganizowano Pałacowe Urodziny – inicjatywę ukierunkowaną na aktywizację społeczności lokalnej

	– Zorganizowano Pałacowy Pokaz Mody – inicjatywę ukierunkowaną na aktywizację społeczności lokalnej W ramach działań międzynarodowych ukierunkowanych na projektowanie usług na obszarach rewitalizowanych: – W ramach projektu Co-design Your Place, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+, przeprowadzono w Siemianowicach Śląskich 5-dniowe międzynarodowe warsztaty projektowe, w których uczestniczyło 18 osób z całego świata, w tym mieszkańcy Siemianowic Śląskich, studenci London College of Communication (UAL London) oraz reprezentanci Student & Innovation House z Kopenhagi. – Wygłoszono wykład o działaniach rewitalizacyjnych podczas Międzynarodowej Konferencji Dream Silesia 2019. – Prezentowano działania związane z rewitalizacją Co-design Your Place podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W ramach projektu Akademia Liderów Społecznych, współfinansowanego ze środków Programu FIO, zorganizowano szereg akcji społecznych adresowanych do mieszkańców miasta: – 1 akcja społeczna pt. „Komiksowy zawrót głowy”, czas trwania 01.2019 – 03.2019. W ramach projektu zorganizowano wydarzenie w formie warsztatu rozwojowego „Komiksowy zawrót głowy”. Ilość liderów zaangażowanych w organizację akcji: 6 os.. Ilość uczestników: 11 os. Odbiorcami wydarzenia były rodziny z dziećmi w wieku 6-10 lat z terenu Siemianowic Śląskich i okolicznych miast. Celem akcji było umożliwienie rodzinom wspólnego i twórczego spędzenia czasu w ramach, którego zostanie stworzona książka/komiks. Zespół realizujący projekt opracował oraz przeprowadził 3-godzinny warsztat rozwojowy dla wskazanej grupy docelowej. W ramach projektu opracowany został scenariusz zajęć warsztatowych oraz materiały niezbędne do ich przeprowadzenia (wzór komiksu, wzór naklejek do wykorzystania przy jego tworzeniu). – 2 akcja społeczna pt. „Zakochaj się w projektach - pierwsze międzysektorowe randki na Śląsku”, czas trwania: 06-02-2019 do 14-02-2019. Ilość liderów zaangażowanych w organizację akcji: 8 os.. Ilość uczestników: 32 os. Celem projektu było zbudowanie sieci współpracy między biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w mieście Siemianowice Śląskie. W ramach akcji społecznej przygotowano i zorganizowano wydarzenie sieciujące, którego celem była integracja w/w sektorów. Wydarzenie przyczyniło się do budowania zaplecza do międzysektorowych, wspólnych projektów w zakresie zdrowia i polityki społecznej w Siemianowicach Śląskich. – 3 akcja społeczna „Siemianowice Śląskie: przeszłość - przyszłości. Historia mówiona jako element dziedzictwa”, czas trwania: 06.2019 – 09.2019. Ilość liderów zaangażowanych w organizację akcji: 5 os.. Ilość uczestników: 28 os. Projekt miał na celu włączenie siemianowickich pasjonatów historii w proces zbierania historii mówionej o kompleksie pałacowym w Siemianowicach Śląskich.
--	--

	Centralnym punktem akcji była konferencja popularno-naukowa pod roboczym tytułem Siemianowice Śląskie: przeszłość – przyszłości. Historia mówiona jako element dziedzictwa wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami, takimi jak: spacer po pałacu, panel dyskusyjny, wystawa pamiątek lokalnych kolekcjonerów, czy zbieranie danych kontaktowych do ludzi chcących podzielić się własną "pałacową" historią (poprzez wystawienie skrzynki i przygotowanie formularzy, a także informowanie o danych kontaktowych do osób z pałacu, które zajmą się zebraniem tych historii). Działania w ramach projektu miały na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia historii mówionej w budowaniu tożsamości, a także kreowania wspólnoty wokół rewitalizacji kompleksu pałacowego. 4 akcja społeczna „Pałacowe historie”, czas trwania: 07.2019 – 11.2019. Ilość liderów zaangażowanych w organizację akcji: 10 os.. Ilość uczestników: 11 os. Ilość uczestników: 25 os. – spotkanie dla Seniorów, 6 os. – spotkanie z samorządowcami i aktywistami, 93 os. – wernisaż wystawy. Celem głównym projektu „Pałacowe Historie” było zebranie wspomnień od seniorów i samorządowców związanych z Pałacem Mieroszewskich–Donnesmarcków w Siemianowicach Śląskich oraz uwiecznienie ich dla przyszłych pokoleń. Projekt został podzielony na dwie części: A i B. Część A polegała na zebraniu i utrwaleniu wspomnień od seniorów z Siemianowic Śląskich związanych z Pałacem. W części B, zebrane zostały i utrwalone wspomnienia samorządowców i aktywistów z Siemianowic Śląskich. W ramach akcji zorganizowany został również wernisaż fotografii w pałacu w Siemianowicach Śląskich.
Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Działania związane z rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi pobudzają aktywność lokalną zarówno w bezpośrednim otoczeniu Pałacu, jak również na terenie całego miasta.
Dalsze działania rewitalizacyjne	Inwestor kontynuuje działania związane z rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi (etap I – dofinansowany ze środków EFRR) oraz przygotowuje się do rozpoczęcia rewitalizacji kolejnych obiektów na terenie kompleksu. W ramach działań społecznych realizowane są projekty: - OGRÓD MOŻLIWOŚCI - szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich (dofinansowany ze środków EFS) - Co-design Your Place (dofinansowany ze środków Erasmus+)

Projekt 5U

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich
2	Zakładane cele	- generalny remont oraz udostępnienie do użytkowania obiektu najstarszej w Polsce Pływalni Miejskiej - poprawa estetyki miasta poprzez remont elewacji obiektu zabytkowego - zwiększenie aktywizacji społecznej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele zostały zrealizowane w 2019 roku
5	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	Trwa badanie dot. ilości osób które skorzystają ze wsparcia infrastruktury w okresie roku po ukończeniu realizacji projektu (zakładana we wniosku o dofinansowanie wartość dla obiektu Pływalni Miejskiej to ok 10 tys. osób)
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Trwa badanie dot. ilości osób z terenów rewitalizowanych, które skorzystają ze wsparcia infrastruktury w okresie roku po ukończeniu realizacji projektu
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekty komplementarne i powiązane realizowane przez MOPS obejmują formy wsparcia realizowane na obiekcie Pływalni Miejskiej, m.in. w ramach projektu „Ucieczka od bierności” skorzystali seniorzy oraz wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost dostępności i jakości usług społecznych, poprzez umożliwienie mieszkańcom subobszaru „Śródmieście ze Srokowcem” jak również „Michałowice z Nowym Światem” aktywności fizycznej, która pozytywnie wpływa na kondycję zdrowotną mieszkańców.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	W 2019 roku zakończono prace rewitalizacyjne w przylegającym do obiektu Pływalni Miejskiej Parku Hutnik.

Projekt 7U

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Nowe funkcje na terenach pomiędzy Parkiem Górnik a Nowym Światem
2	Zakładane cele	Stworzenie przestrzeni zgodnej z zapisami MPZP, poszukiwanie płaszczyzny kompromisu pomiędzy zamierzeniami inwestora (teren prywatny), a oczekiwaniami Gminy.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4	Kiedy będą zrealizowane?	Teren stanowi własność prywatną i to w gestii właściciela leży przystąpienie do zagospodarowania przestrzeni. Gmina nie ma wpływu na termin rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia.
5	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	Nie dotyczy
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Nie dotyczy
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Nie dotyczy
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Nie dotyczy
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Obszar wymaga uporządkowania i włączenia do tkanki miejskiej poprzez jego sukcesywne zagospodarowanie zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego obowiązujących na przedmiotowym obszarze.

Projekty społeczne

Projekt 5S

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	„SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej”
2.	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 100 osób w wieku aktywności zawodowej należących do społeczności lokalnych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich tereny uznane w Lokalnym Programie Rewitalizacji za zdegradowane wymagające rewitalizacji (Michałkowice z "Nowym Światem" oraz Śródmieście ze Srokowcem), w okresie od 01.06.2018 r. - 31.05.2020 r
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	W chwili obecnej projekt jest w trakcie realizacji.
4.	Kiedy będą zrealizowane?	Projekt realizowany jest do 31.05.2020 r .
5.	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	W trakcie realizacji projektu 101 osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury.
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	101 osób.
7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 1. Program Aktywności Lokalnej - budowanie kompetencji Społecznych – praca środowiskowa, indywidualne poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, warsztaty z autoprezentacji, grupa samopomocowa dla osób bezrobotnych. 2. Program Aktywności Lokalnej - wsparcie dla osób Niepełnosprawnych – grupa wsparcia, wyjazdowe zajęcia grupy wsparcia, wystawa prac osób niepełnosprawnych. 3. Program Aktywności Lokalnej - wsparcie osób mających problemy opiekuńczo - wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – trening kompetencji wychowawczych, grupa samopomocowa, indywidualne konsultacje pedagogiczno – psychologiczne. 4. Program Aktywności Lokalnej - wsparcie edukacyjne oraz prozatrudnieniowe – poradnictwo zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe podnoszące lub zmieniające kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe.
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” można było powiązać projekty współfinansowane ze środków EFS z projektem współfinansowanym ze środków EFRR, który wskazany został do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zajęcia w ramach „SORSAL.....” odbywały się w wyremontowanych w ramach projektu "Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne" -poddziałanie 10.03.01. pomieszczeniach Pałacu. Realizacja projektu „SORSAL.....” pozwoliła na powiązanie projektów przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Projekt 7S

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	Zagospodarowanie parterów na świetlice, Centrum Usług Społecznych, kluby dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby starsze)
2.	Zakładane cele	- aktywizacja osób starszych - wspieranie rozwoju posiadanych zdolności i umiejętności - promocja zdrowego stylu życia - rozwijanie zainteresowań seniorów lub: - wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne, prawne, - realizacja programów socjoterapeutyczno - profilaktycznych, edukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wychowawczych min. - aktywizowanie dzieci i młodzieży - kształtowanie pozytywnych wzorców, kontaktów, relacji interpersonalnych z innymi ludźmi - prowadzenie wczesnej interwencji w przypadku dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka - wspieranie rozwoju posiadanych zdolności i umiejętności - promocja zdrowego stylu życia - rozwijanie zainteresowań - wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie zrealizowano
4.	Kiedy będą zrealizowane?	-
5.	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	Nie zrealizowano
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Nie zrealizowano
7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Nie zrealizowano
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Nie zrealizowano
9.	Dalsze działania rewitalizacyjne	-

Projekt 4S

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	Nowe oblicze Nowego Świata – centrum społeczno – kulturalne osiedla z ofertą świetlicy środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego.
2.	Zakładane cele	- budowa świetlicy środowiskowej, - budowa boiska - remont zniszczonych budynków komunalnych, - rozwiązanie problemu sanitarnego, - utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, zwłaszcza stworzenie warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, - wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne, prawne, - realizacja programów socjoterapeutyczno - profilaktycznych, edukacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych i wychowawczych min. - aktywizowanie dzieci i młodzieży - kształtowanie pozytywnych wzorców, kontaktów, relacji interpersonalnych z innymi ludźmi - prowadzenie wczesnej interwencji w przypadku dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka - wspieranie rozwoju posiadanych zdolności i umiejętności - promocja zdrowego stylu życia - rozwijanie zainteresowań - wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie zrealizowano
4.	Kiedy będą zrealizowane?	-
5.	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Nie zrealizowano
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Nie zrealizowano
7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Nie zrealizowano
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Nie zrealizowano
9.	Dalsze działania rewitalizacyjne	-

Projekt 6S

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	Stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych.
2.	Zakładane cele	- aktywizacja osób starszych - wspieranie rozwoju posiadanych zdolności i umiejętności - promocja zdrowego stylu życia - rozwijanie zainteresowań seniorów
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie zrealizowano, zmieniono założenia – złożono wniosek do MRPiPS w celu utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego
4.	Kiedy będą zrealizowane?	Po uzyskaniu dofinansowania
5.	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Projekt zakłada 40 osób
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Nie zrealizowano
7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Nie zrealizowano
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Nie zrealizowano
9.	Dalsze działania rewitalizacyjne	-

Projekt 8S

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Aktywni na sportowo - turniej dzielnic oraz amatorska liga piłkarska - integracja lokalnych społeczności z różnych dzielnic, ze szczególnym uwzględnieniem integracji mieszkańców Michałkowic i Nowego Świata (badania ankietowe przed i po każdym sezonie ligowym); - zwiększanie się zainteresowania udziałem w tym przedsięwzięciu (porównywanie ilości chętnych drużyn do udziału w rozgrywkach w poszczególnych latach); - zmiana stereotypów (mentalności i wyobrażeń) mieszkańców innych rejonów miasta dotyczących mieszkańców Nowego Świata; - zredukowanie zachowań i działań kryminogennych poprzez promowanie zasad fair play w sportowej rywalizacji (analiza statystyk w tym zakresie na przestrzeni lat).
2	Zakładane cele	
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Cele są w trakcie realizacji: - w 2019 roku w ramach współpracy z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową odbywa się akcja "Piłka nożna w naszych osiedlach" - w formie regularnych zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z poszczególnych dzielnic Siemianowic Śląskich, w tym z Michałkowic i Nowego Świata. Podsumowaniem akcji w okresie letnim i zimowym jest Turniej Dzielnic (Wielkanocny i Świąteczny). Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z SSM, MOSiR "Pszczelnik" oraz siemianowickimi szkołami (udostępnianie obiektów). Turnieje dzielnic odbywają się pod Patronatem Prezydenta Miasta. W związku z brakiem zainteresowania zrezygnowano z organizacji jednej z części projektu - Wakacyjnej Piłkarskiej Ligi dla dzieci
4	Kiedy będą zrealizowane?	W kolejnych latach (2020-2022) przewidujemy dalsze wspieranie akcji realizowanej przez SSM na boiskach i w okresie zimowym w halach (salach gimnastycznych), w poszczególnych dzielnicach. W tym roku w związku z koronawirusem niestety turniej Wielkanocny dzielnic został odwołany.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury? (Imprez)	Z zajęć i turniejów dzielnic w piłce nożnej skorzystało w 2019 roku ponad 120 osób
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Osoby z terenu rewitalizowanego (Nowy Świat i Michałkowice) stanowiły w tej grupie ok. 40 osób

7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	W ramach projektu wspierano bezpośredniego organizatora (SSM) poprzez udostępnianie miejskich obiektów (boiska szkolne, sale gimnastyczne, obiekty MOSiR "Pszczelnik") a także zakup medali na okazjonalne (Wielkanocny i Świąteczny) turnieje dzielnic. Zajęcia piłkarskie oraz turnieje - z racji dużej popularności tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży, także z terenów rewitalizowanych, pozytywnie wpływają na integrację z mieszkańcami innych dzielnic Siemianowic Śląskich
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	(integracja poprzez sport, profilaktyka patologii, kształtowanie pozytywnych nawyków ruchowych, zwieranie nowych znajomości - zmiana mentalności i sposobu postrzegania (stereotypów) dzieci z terenów rewitalizowanych przez dzieci z innych obszarów miasta)
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Przewiduje się kontynuację działań (wspieranie organizacji zajęć i turniejów) w kolejnych latach (w związku z koronawirusem działania przewidziane na 2020 rok mogą zostać odwołane)

Projekt 9S

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Integracja Michałkowic i Nowego Świata z pozostałą częścią miasta poprzez wspólne i cykliczne działania kulturalne
2	Zakładane cele	Wzmocnienie poczucia przynależności – małe ojczyzny, integracja z innymi dzielnicami, edukacja kulturalna, wyrobienie nawyków korzystania z oferty kulturalnej siemianowickich instytucji kultury.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Cele są w trakcie realizacji: - w dniach 7-9 czerwca w ramach Dni Siemianowic Śląskich odbyły się otwarte imprezy dla mieszkańców przy SCK - Parku Tradycji w Michałkowicach, natomiast 6 września 2019 roku odbył się festyn rodzinny pt. "Pożegnanie Wakacji na Nowym Świecie".
4	Kiedy będą zrealizowane?	Przewiduje się kontynuację działań jak powyżej w kolejnych latach (w związku z koronawirusem działania przewidziane na 2020 rok mogą zostać odwołane)
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury? (Imprez)	Z imprez w Michałkowicach w ramach Dni Siemianowic skorzystało ok. 20 000 osób, z imprez w ramach festynu na Nowym Świecie skorzystało ok. 150 osób
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	W przypadku imprez w ramach Dni Siemianowic nie jesteśmy w stanie określić, w przypadku festynu na Nowym Świecie można założyć, że ok. 90% stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Imprezy integracyjne w ramach Dni Siemianowic organizowało Siemianowickie Centrum Kultury przy wsparciu Wydziału Kultury i Sportu (czyli budżet Gminy), impreza na Nowym Świecie organizowana była przez Wydział Kultury i Sportu przy współpracy z SCK-Park Tradycji.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Zakładając że każda impreza otwarta dla mieszkańców sprzyja ich integracji, a dodatkowo spełniają cel wyrobienia nawyku korzystania z oferty kulturalnej miasta.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Przewiduje się kontynuację działań (organizacji imprez w dzielnicy Michałkowice oraz w dzielnicy Nowy Świat) w kolejnych latach (w związku z koronawirusem działania przewidziane na 2020 rok mogą zostać odwołane)

Projekty Gospodarcze:

Projekt 2G

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Business Park Srokowiec spójny komunikacyjnie z GPP – Górnośląskim Parkiem Przemysłowym w Katowicach – uzbrojenie terenów brownfield (ZIT 3.1.1)
2	Zakładane cele	Celem projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego Miasta i regionu poprzez nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield w Siemianowicach Śląskich. Miasto Siemianowice Śląskie to miasto przemysłowe, na terenie, którego mimo niewielkiej powierzchni (25 km ²) prowadzono intensywną eksploatację złóż węgla kamiennego oraz rudy cynku i ołowiu. Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie obszarów przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta w sieć kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną, oświetleniową i drogową wraz z planem promocji.
		Działania Gminy - Regulacja stanów prawnych terenów, położonych w pobliżu (400m) Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach, celem przygotowania terenu inwestycyjnego o pow. 14,47 ha (Obszar A – 2,73 ha, Obszar B – 11,74 ha)
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4	Kiedy będą zrealizowane?	Brak danych
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	-
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	-
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Trwają działania zmierzające do pełnego uzbrojenia terenów brownfield i utworzenia Business Park Srokowiec.

Projekt 5G

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości
2	Zakładane cele	Celem projektu było zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 15 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących obszar Gminy Siemianowice Śląskie, należących do jednej z grup w trudnej sytuacji rynkowej (narażonej na wykluczenie zawodowe), poprzez pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie przyznanych bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Tym samym celem projektu był rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Gminie i spadek bezrobocia w mieście.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Nie dotyczy-cele zostały już zrealizowane
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	W projekcie nie uwzględniano działań infrastrukturalnych. Z działań w projekcie skorzystało 15 osób.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	8
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	przyznanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Zmniejszenie bezrobocia i aktywizacja zawodowa jego mieszkańców. Tworzenie nowych miejsc pracy. Ożywienie gospodarcze terenu.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Zatrudnianie przez Uczestników Projektu osób, które zamieszkują obszary rewitalizowane miasta.

Projekt 1G

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	Rewitalizacja terenu byłej Huty „Jedność” S.A. poprzez nadanie nowych funkcji techniczno-produkcyjnych.
2.	Zakładane cele	Rewitalizacja terenu w pobliżu centrum miasta oraz nadanie mu nowych funkcji gospodarczo-społecznych.
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4.	Kiedy będą zrealizowane?	Teren stanowi własność prywatną i to w gestii właściciela leży przystąpienie do zagospodarowania przestrzeni. Gmina nie ma wpływu na termin rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia. Na dzień obecny uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru, które umożliwia realizację zabudowy usługowej oraz zabudowy usług o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ² .
5.	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Nie dotyczy
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Nie dotyczy
7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Nie dotyczy
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Nie dotyczy
9.	Dalsze działania rewitalizacyjne	Obszar wymaga przede wszystkim remediacji, a w dalszym kroku uporządkowania i włączenia do tkanki miejskiej poprzez jego sukcesywne zagospodarowanie zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego obowiązujących na przedmiotowym obszarze. Po przeprowadzeniu remediacji terenu przez jego właściciela, możliwe będzie przystąpienie do prac planistycznych zmierzających do częściowej zmiany kierunków zagospodarowania południowej części obszaru pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Projekt 3G

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Rozwój instytucji wspomagających i kreujących przedsiębiorczość.
2	Zakładane cele	Powołanie Biura Obsługi Inwestora Powołanie Rady Gospodarczej Kreowanie przedsiębiorczości poprzez cykliczne szkolenia/spotkania zarówno przedsiębiorców, młodzieży jak i najmłodszych Organizacja warsztatów i spotkań dla sektora MMŚP w Siemianowicach Śląskich
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak. W strukturach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie utworzono Biuro Obsługi Inwestora. Prezydent Miasta powołał Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie, której skład stanowi 17 członków – przedstawicieli środowiska biznesu oraz nauki. Urząd Miasta organizuje cykliczne szkolenia i spotkania dla siemianowickich przedsiębiorców, a także dla młodzieży i najmłodszych. Wśród organizowanych inicjatyw wymienić można m.in. liczne szkolenia (RODO, szkolenie sprzedażowe, marketing w Social Media itd.), Targi Firm, Śniadania Biznesowe, Konkurs „Firma na Start” czy półkolonie Akademia Przedsiębiorczości.
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele są realizowane.
5	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	Z realizowanych inicjatyw korzystają przedsiębiorcy i przedstawiciele firm, a także młodzież i uczniowie z terenu całego miasta.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Część osób korzystających z inicjatyw stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	brak
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do zwiększenia aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy, a także wzrostu przedsiębiorczości.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	W ramach projektu nadal kontynuowane będą inicjatywy skierowane do przedsiębiorców, a także młodzieży, zwiększające poziom przedsiębiorczości mieszkańców, takie jak spotkania informacyjne, szkolenia, Śniadania Biznesowe, Akademia Przedsiębiorczości i Konkurs „Firma na Start”.

Projekt 4G

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Poprawa warunków i klimatu dla lokalnego biznesu oraz inwestorów zewnętrznych.
2	Zakładane cele	Rozpoznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców poprzez przeprowadzenie ankiet wśród przedstawicieli lokalnych firm i przedsiębiorstw, analizę danych posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy, analizę potencjału inwestycyjnego terenów gminnych pod kątem przyszłego wykwalifikowania i wyspecjalizowania potencjalnych pracowników. Współpraca z nowo powstałym na terenie miasta Biurem Obsługi Inwestora, w zakresie promowania przedsiębiorczości, stwarzania możliwości założenia działalności gospodarczej oraz nieodpłatne świadczenie usług doradztwa na początkowym etapie jej rozwoju. Stworzenie Siemianowickiej Akademii Przedsiębiorczości
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak. W mieście cyklicznie przeprowadzane są ankiety wśród przedstawicieli lokalnych firm i przedsiębiorstw, oraz analizy potencjału inwestycyjnego terenów gminnych pod kątem przyszłego wykwalifikowania i wyspecjalizowania potencjalnych pracowników. Pozyskane informacje przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności potencjału zawodowego lokalnej kadry pracowniczej, m.in. poprzez otwarcie nowych klas branżowych. Poprzez podejmowane przez Biuro Obsługi Inwestora inicjatywy, takie jak Śniadania Biznesowe, jak również poprzez cykliczne posiedzenia Rady Gospodarczej, możliwa jest regularna wymiana doświadczeń między firmami
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele są realizowane.
5	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	Z realizowanych inicjatyw skorzystało wielu przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska biznesu z Siemianowic Śląskich.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Część osób korzystających ze wsparcia infrastruktury stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	brak
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności potencjału zawodowego lokalnej kadry pracowniczej
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	W Gminie nadal kontynuowane będą podejmowane dotychczas działania.

Projekt 6G

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Program aktywizacji i wykorzystania potencjału seniorów ułatwiający powrót rodziców na rynek pracy.
2	Zakładane cele	- integracja mieszkańców, zacieśnienie więzi społecznych - współpraca międzypokoleniowa - wykorzystanie potencjału i talentów ludzkich i ich promocja - rozwijanie aktywności społecznej poprzez zadania - poszerzanie wiedzy kulinarnej - powrót do tradycji rodzinnego spędzania czasu
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Cele w większości zrealizowano, ale poprzez inne zadania niż wykazane w karcie projektu, oraz w innych lokalizacjach niż podane. Skupiono się głównie na jednostkach miejskich SCK, Biblioteka Miejska, Pływalnia Miejska, MOSIR, Muzeum Miejskie ze względu na dostępność dla Seniorów w różnych dzielnicach miasta. Zadania zmieniono ze względu na różne potrzeby seniorów oraz dostosowanie ich do zainteresowań oraz ich możliwości. Cele poszerzono o rozwijanie aktywności ruchowej, edukację cyfrową, zdrowotną i kulturalną. Na uwagę zasługuje fakt, iż posiadają swojego Koordynatora w Biurze ds. Seniorów UM, oraz swoją reprezentację - Siemianowicką Radę Seniorów
4	Kiedy będą zrealizowane?	zadania realizowane są na bieżąco
5	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	Brak danych
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Brak danych
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	- wynajem pomieszczeń na działania senioralne - wsparcie finansowe UM w organizacji imprez senioralnych (kulturalnych, sportowych, informacyjno-edukacyjnych) - organizacja imprez dedykowanych seniorom
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Osiągnięto wysoki stopień integracji senioralnej i współpracy między klubami seniorów. Organizowano różne imprezy integrujące jak np. Senioralia. Poprzez realizację różnego rodzaju zadań, Seniorzy stali się ważną grupą społeczną.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Rozwój i poszerzanie istniejących działań, propagowanie dobrych praktyk mających na celu wsparcie seniorów, ich integrację oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i izolacji

Projekty ekologiczne

Projekt 3E

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła (ZIT 4.3.1)
2.	Zakładane cele	- podłączenie budynków do sieci CO, - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych - poprawa stanu środowiska naturalnego
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4.	Kiedy będą zrealizowane?	Cele zostały zrealizowane w 2019 roku
5.	Ile osób skorzystało ze wsparcia infrastruktury?	W wyniku realizacji projektu 44 gospodarstwa domowe w budynkach przy ul. Sobieskiego 8, 9, 10, 10a, 36 posiadają lepszą klasę zużycia energii
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	100% - projekt realizowany na obszarze rewitalizowanym
7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców subobszaru „Śródmieście ze Srokowcem” poprzez likwidację nieefektywnych palenisk węglowych oraz tym samym poprawę jakości powietrza
9.	Dalsze działania rewitalizacyjne	W rejonie ul. Sobieskiego realizowana jest m.in. wymiana nawierzchni jezdni oraz chodników a także remont pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne

Projekty 4E

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1.	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie 4.3.1/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie (RPO WSL) Etap 1.
2.	Zakładane cele	Cele częściowe: - ocieplenie budynków, - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - częściowa realizacja założeń PGN w gminie, - wzrost komfortu użytkowania budynków, - wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
3.	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4.	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki zostały zrealizowane w 2019 i 2020 roku. Zgodnie z wnioskiem końcowym wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte 28.01.2020 r.
5.	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	W wyniku realizacji projektu skorzystały 103 gospodarstwa mieszczące się w budynkach wielorodzinnych przy ul. Żwirki i Wigury, Deji, Wróblewskiego, Michałkowickiej oraz Wiejskiej.
6.	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Projekt realizowany na obszarze rewitalizowanym: ul. Żwirki i Wigury, ul. Deji, ul. Michałkowicka.

7.	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8.	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców obszaru „Śródmieście ze Srokowcem” oraz obszaru "Michałkowice z Nowym Światem". Nastąpiła również poprawa jakości środowiska dzięki rozwiązaniom proekologicznym w budownictwie mieszkaniowym.
9.	Dalsze działania rewitalizacyjne	Planuje się kolejne etapy: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie Etap 2 (RPO WSL), (projekt w trakcie realizacji) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie Etap 3 (POIŚ) w trakcie realizacji, Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie Etap 4 (POIŚ) w trakcie przygotowań do złożenia dokumentacji aplikacyjnej

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie 4.3.1/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – ETAP 2 (RPO WSL)
2	Zakładane cele	Cele częściowe: - ocieplenie budynków, - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - częściowa realizacja założeń PGN w gminie, - wzrost komfortu użytkowania budynków, - wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	NIE
4	Kiedy będą zrealizowane?	Projekt w trakcie realizacji.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Z projektu skorzystały 62 gospodarstwa mieszczące się w budynkach wielorodzinnych przy ul. Kołłątaja 1, 2, 3, 4, 9, 10, oraz Żwirki i Wigury 3
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	100% - projekt realizowany na obszarze rewitalizowanym
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców obszaru "Michałkowice z Nowym Światem". Nastąpiła również poprawa jakości środowiska dzięki rozwiązaniom proekologicznym w budownictwie mieszkaniowym.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Planuje się kolejne etapy: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie Etap 3 (POIS) w trakcie realizacji, Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie Etap 4 (POIS) w trakcie przygotowań do złożenia dokumentacji aplikacyjnej

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie 4.3.1/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie (POIS) Etap 3.
2	Zakładane cele	Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, należących do Gminy Siemianowice Śląskie. Inwestycja dotyczy głębokiej termomodernizacji 18-stu budynków mieszkalnych komunalnych na terenie Siemianowic Śl.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki nie zostały zrealizowane. Projekt w trakcie realizacji.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	W wyniku realizacji projektu gospodarstwa mieszczące się w budynkach wielorodzinnych przy ul. Kołłątaja, Al. Sportowców, ul. Staszica, ul. Parkowej, ul. Śląskiej, ul. Poprzecznej, ul. Bocznej, ul. Szefflera.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Projekt realizowany na obszarze rewitalizowanym tj. ul. Kołłątaja, ul. Staszica, ul. Parkowa, ul. Śląska, ul. Poprzeczna, ul. Boczna, ul. Szefflera.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców. Nastąpiła również poprawa jakości środowiska dzięki rozwiązaniom proekologicznym w budownictwie mieszkaniowym.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Planuje się kolejny etap: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie Etap 4 (POIS) w trakcie przygotowań do złożenia dokumentacji aplikacyjnej

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie 4.3.1/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie (POIS) Etap 4. Projekt przed złożeniem.
2	Zakładane cele	Cele częściowe: - ocieplenie budynków, - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - częściowa realizacja założeń PGN w gminie, - wzrost komfortu użytkowania budynków, - wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki nie zostały zrealizowane. Projekt w trakcie złożenia dokumentacji aplikacyjnej.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	W wyniku realizacji projektu skorzystają gospodarstwa mieszczące się w budynkach wielorodzinnych przy ul. Fabrycznej 1, Śmiłowskiego 12, Sienkiewicza 6 oraz Sobieskiego 9.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	100% - projekt realizowany na obszarze rewitalizowanym. Wszystkie budynki objęte projektem mieszczą się na terenie rewitalizowanym.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie będzie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpi m.in. poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Nastąpi również poprawa jakości środowiska dzięki rozwiązaniom proekologicznym w budownictwie mieszkaniowym.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Modernizacja kolejnych budynków wielorodzinnych w Gminie Siemianowice Śląskie.

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Stworzenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z rozbudową rowerowych szlaków komunikacyjnych oraz punktów przesiadkowych (ZIT 4.5.1)
2	Zakładane cele	- utworzenie 4 Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych wraz z obiektami typu Bike&Ride oraz Park&Ride - utworzenie ok 17km dróg rowerowych - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w mieście
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele zostały zrealizowane w 2018 roku
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Szacuje się, iż ze wspartej infrastruktury (ZCP, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe) skorzystali wszyscy mieszkańcy miasta
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	18 tys. osób – szacuje się, iż ze wspartej infrastruktury skorzystali wszyscy mieszkańcy terenów rewitalizowanych
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców subobszaru „Śródmieście ze Srokowcem” poprzez likwidację nieefektywnych palenisk węglowych oraz tym samym poprawę jakości powietrza
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	W rejonie ul. Sobieskiego realizowana jest m.in. wymiana nawierzchni jezdni oraz chodników a także remont pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne

Projekt 2E

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Zielień miejska – naturalne bogactwo miejskie / Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Zielień Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie (POIS)
2	Zakładane cele	Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w Siemianowicach Śląskich. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni, powstałych dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych i rewitalizacji istniejących parków. Zwiększenie zielonych terenów umożliwi między innymi: • nadanie nowych funkcji tym terenom (istotnych i dostępnych dla społeczności lokalnej), • poszerzenie zakresu roślinności w mieście (co udowadnia ekologiczność niniejszego rozwiązania oraz znacznie zwiększy występującą w Siemianowicach Śląskich różnorodność biologiczną), • przywrócenie aktywności biologicznej na terenach przemysłowych (obecnie nie nadających się do jakichkolwiek działań), • zwiększenie obszarów wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz mieszkańców sąsiadujących miast, • zwiększenie bezpiecznych miejsc lęgowych dla ptaków poprzez usunięcie zagrożeń w postaci zanieczyszczeń i zdegradowanych terenów przemysłowych. Całkowita powierzchnia terenu objętego projektem stanowi 468 300 m². W tym tereny zielone 464 215m², co stanowi 99,13% całej powierzchni objętej projektem. W wyniku realizacji projektu powstanie 89 550m² nowej powierzchni biologicznie czynnej oraz 5 585m² ścieżek pieszych i pieszo - rowerowych
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4	Kiedy będą zrealizowane?	Projekt w trakcie realizacji

5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Mieszkańcy obszaru zrewitalizowanego oraz pozostałej części miasta.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie w tym mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez zwiększenie terenów wypoczynków i rekreacji
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Zielień Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie 2.

Projekty 6E

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZIT 4.3.1)/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (MOSIR)
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej MOSIR w Siemianowicach Śląskich. Cele cząstkowe: - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - częściowa realizacja założeń PGN w gminie. Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące: - wzrost komfortu użytkowania budynków, - stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych, - wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 2018. Protokół odbioru końcowego z dnia 09.03.2018 r. Oświadczenie dotyczące osiągnięcia wskaźników produktu z dnia 30.11.2018 r.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie w tym: osoby korzystające z MOSIRu.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie zarówno z terenów rewitalizowanych jak i pozostałych części miasta. Budynek MOSIR-u nie znajduje się na terenie rewitalizowanym.

7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym.

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZIT 4.3.1)/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (PUP i MOPS)
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej PUP i MOPS w Siemianowicach Śląskich. Cele częściowe: - ocieplenie budynków, - zastosowanie instalacji OZE (fotowoltaika MOPS), - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - częściowa realizacja założeń PGN w gminie.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki zostały zrealizowane w 2017-2018 roku - Budynek PUP: Protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dnia 21.08.2017 r. - Budynek MOPS: Protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dnia 03.10.2017 r.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie w tym: pracownicy i petenci PUPu oraz MOPSu.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Ze wspartej infrastruktury korzystają zarówno osoby z obszarów rewitalizowanych jak i z poza obszaru. Budynek MOPS-u znajduje się na terenie rewitalizowanym budynek PUP znajduje się poza tym obszarem.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym.

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZIT 4.3.1)/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich).
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 1) w Siemianowicach Śląskich. Cele częściowe: - ocieplenie budynku, - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynku, - obniżenie kosztów utrzymania budynku, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - wzrost komfortu użytkowania budynku, - wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie.
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki nie zostały zrealizowane. Projekt w trakcie realizacji.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie w tym: pracownicy i uczniowie i uczennice SP1.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Ze wspartej infrastruktury korzystają zarówno osoby z obszarów rewitalizowanych jak i z poza obszaru. Budynek SP1 znajduje się poza obszarem rewitalizacji.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym.

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZIT 4.3.1)/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3, Siemianowice Śląskie - ETAP 1)
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej segmentów ZSS (etap 1). Cele cząstkowe: - ocieplenie segmentów oraz elementów wewnętrznych, - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - częściowa realizacja założeń PGN w gminie.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Tak
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki zostały zrealizowane w 2019 r.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie w tym: pracownicy i uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Sportowych.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Ze wspartej infrastruktury korzystają zarówno osoby z obszarów rewitalizowanych jak i z poza obszaru. Budynek Zespołu Szkół sportowych znajduje się poza obszarem rewitalizacji.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZSOiZ przy ul. Budryka i SP20 przy ul. Lipowej w Siemianowicach Śląskich), - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich).

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZIT 4.3.1)/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych – Etap 2, ZSTiO Meritum, UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich).
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych w Siemianowicach Śląskich. Cele cząstkowe: - ocieplenie budynków, - zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - wzrost komfortu użytkowania budynków, - wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki nie zostały zrealizowane. Termin zakończenia realizacji projektu to: 15.08.2021 r.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie w tym: pracownicy i uczniowie/uczennice szkół objętych projektem oraz pracownicy i petenci UM.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Ze wspartej infrastruktury korzystają zarówno osoby z obszarów rewitalizowanych jak i z poza obszaru. Budynek Zespołu Szkół Sportowych znajduje się poza obszarem rewitalizacji. Budynek ZSTiO Meritum oraz UM znajduje się na obszarze rewitalizacji.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym.

Projekty 7E

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZIT 4.3.1)/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (ZSOiZ przy ul. Budryka i SP20 przy ul. Lipowej w Siemianowicach Śląskich).
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych w Siemianowicach Śląskich. Cele cząstkowe: - ocieplenie budynków, - zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynków, - obniżenie kosztów utrzymania budynków, - poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, - wzrost komfortu użytkowania budynków, - wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.
3	Czy zrealizowano cele projektu?	Nie
4	Kiedy będą zrealizowane?	Cele/wskaźniki nie zostały zrealizowane. Termin zakończenia realizacji projektu to: 15.08.2021 r.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury?	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie w tym: pracownicy i uczniowie/uczenice szkół objętych projektem.
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego?	Ze wspartej infrastruktury korzystają zarówno osoby z obszarów rewitalizowanych jak i z poza obszaru. Budynek ZSOiZ oraz SP20 znajduje się poza obszarem rewitalizacji.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu?	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym.

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie - ZIT 4.3.1/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii - ETAP 1 (RPO WSL)
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Siemianowice Śląskie. Cele cząstkowe to: - obniżenie wydatków na energię, - spełnienie przez zmodernizowany system oświetleniowy normy PN-EN 13201, - osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO2, - obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia.
3	Czy zrealizowano cele projektu	Zrealizowano cele/wskaźniki projektu w 2018 r. (audyt powykonawczy aktualizacja 2018 r.).
4	Kiedy będą zrealizowane	Cele i wskaźniki zrealizowane. Projekt zrealizowany.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego	Projekt realizowany na obszarze całego miasta, w tym na obszarze rewitalizacji. Z projektu skorzystali zarówno mieszkańcy terenu rewitalizowanego, jak i mieszkańcy pozostałej części miasta.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców. Modernizacja oświetlenia ulicznego wpłynęła na wzrostu bezpieczeństwa na drogach.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Kolejne etapy: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii – Etap 2 (RPO WSL)

KARTA EWALUACYJNA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO		
1	Nazwa projektu	Tytuł zgodny z kartą projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie - ZIT 4.3.1/ Tytuł zgodny z dokumentacją aplikacyjną: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii - ETAP 2 (RPO WSL)
2	Zakładane cele	Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Siemianowice Śląskie. Cele cząstkowe to: - obniżenie wydatków na energię, - spełnienie przez zmodernizowany system oświetleniowy normy PN-EN 13201, - osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO ₂ , - obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia.
3	Czy zrealizowano cele projektu	Nie. Projekt w trakcie realizacji.
4	Kiedy będą zrealizowane	Projekt będzie realizowany do dnia 30.06.2020r.
5	Ile osób skorzystało ze wspartej infrastruktury	Mieszkańcy Gminy Siemianowice Śląskie
6	Ile w tym stanowiły osoby z terenu rewitalizowanego	Projekt realizowany na obszarze całego miasta, w tym na obszarze rewitalizacji. Z projekty skorzystali zarówno mieszkańcy terenu rewitalizowanego oraz mieszkańcy pozostałej części miasta.
7	Jakie formy wsparcia były realizowane w ramach projektu	Projekt nie obejmował realizacji form wsparcia.
8	Wpływ projektu na subobszar rewitalizacji	Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców. Modernizacja oświetlenia ulicznego wpłynie na wzrostu bezpieczeństwa na drogach.
9	Dalsze działania rewitalizacyjne	Wymiana opraw oświetlenia na obszarze rewitalizacji.

SPIS RYSUNKÓW I FOTOGRAFII

Rysunek 1. Mapa Siemianowic Śląskich z zaznaczonym obszarem zdegradowanym,	5
Rysunek 2 Podział projektów rewitalizacyjnych, Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022.....	6
Rysunek 3 Planty Michałkowickie, źródło: Biuro Prasowe UM	9
Rysunek 4 Pałac Rheinbabenów, źródło: Biuro Prasowe UM	10
Rysunek 5 Świetlica Środowiskowa przy ul. Matejki, źródło: Biuro Prasowe UM.....	11
Rysunek 6 Pałac Donnersmarcków, źródło: Biuro prasowe UM	12
Rysunek 7 Park Hutnik, źródło: Biuro prasowe UM	13
Rysunek 8 Park Hutnik, źródło: Biuro prasowe UM	16
Rysunek 9 Skwer Laura, źródło: Biuro prasowe UM	16
Rysunek 10 Świetlica środowiskowa przy ul. Matejki, źródło: Biuro prasowe UM.....	17
Rysunek 11 Osiedle Nowy Świat, źródło: Biuro prasowe UM	21
Rysunek 12 Park&Ride wraz ze ścieżką rowerową, Bażantarnia, źródło: Biuro prasowe UM	22

SPIS TABEL

Tabela 1 Projekty rdzeniowe urbanistyczno infrastrukturalne	9
Tabela 2 Projekty uzupełniające urbanistyczno - infrastrukturalne.....	11
Tabela 3 Projekty rdzeniowe społeczne	13
Tabela 4 Projekty Uzupełniające społeczne	15
Tabela 5 Projekty rdzeniowe gospodarcze.....	18
Tabela 6 Projekty uzupełniające gospodarcze	19
Tabela 7 Projekty rdzeniowe ekologiczne	20
Tabela 8 Projekty uzupełniające ekologiczne.....	21
